



Diplomatura de estudio de Project Management

Trabajo aplicativo N°3

Línea base de costos

Nombre del curso:

Dominio planificación

Integrantes:

Aldo Chavez Toledo

Fabián Gallo Chuquiyuri

Luis Alberto Rojas Crisóstomo


Yhony Erick Mendoza Icarayme

18 de mayo del 2023



2. Definir línea base del proyecto

La curva S es la siguiente:

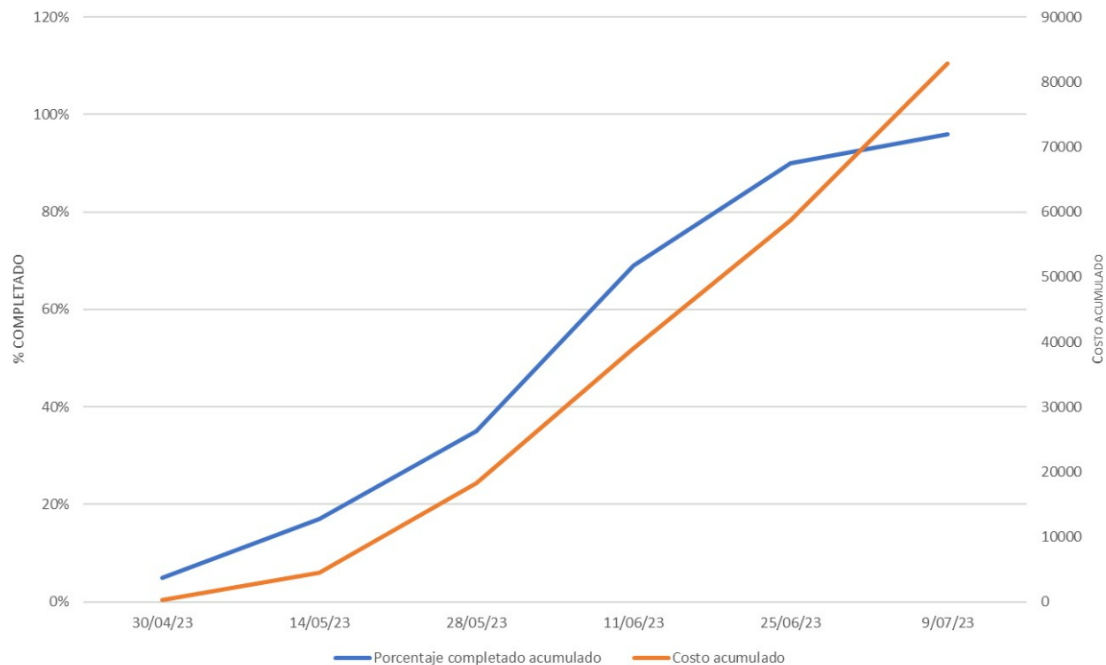

3. Definir presupuesto del proyecto en el tiempo

Primero, hallamos la línea base de costos:

Línea base de costos = Costos de los paquetes de trabajo + reserva de contingencia

Hemos estimado que la reserva de contingencia es de S/.15 000.00, por ello:

$$\text{Línea base de costos} = \text{S/. } 117\,812.38 + \text{S/. } 15\,000.00$$

$$\text{Línea base de costos} = \text{S/. } 132\,812.38$$

Para hallar el presupuesto del proyecto, realizamos la siguiente operación:

$$\text{Presupuesto} = \text{Línea base de costos} + \text{reserva de gestión}$$

Hemos estimado que la reserva de gestión es de S/.3 000.00, por ello:

$$\text{Presupuesto} = \text{S/. } 132\,812.38 + \text{S/. } 3\,000.00$$

$$\text{Presupuesto} = \text{S/. } 135\,812.38$$



4. Definir límites de financiamiento

Hemos definido nuestras reservas de contingencia y gestión en los siguientes montos:

- Reserva de contingencia: S/. 15 000.00
- Reserva de gestión: S/. 3 000.00
